PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SANTA ISABEL

Proyecto	Estatus	Inversión Estimada
Construcción de Mejoras a Varios Tanques del Área Operacional de Coamo	Construcción (40%)	$ 337,970.00
Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Proceso y Control de PAS Santa Isabel	Completado	$ 151,100.51
Mejoras a Estación de Bombas de Alcantarillado Sanitario Playita Cortada	Completado	$ 59,579.00
Proyecto Renovación Sistema Sanitario PR-153, Casco Urbano Santa Isabel Fase I	Planificación	$ 370,948.00
Proyecto Renovación Sistema Sanitario PR-153, Casco Urbano Santa Isabel Fase II	Planificación	$ 298,117.00

PROYECTOS REALIZADOS SANTA ISABEL

Proyecto	Descripción	Estatus
Reemplazo de válvulas de control en el W.I.C. y frente al pozo VI en Paso Seco	Se remplazaron válvulas de control para presiones en el pueblo de Santa Isabel para mantener una presión mayor hacia las "Booster"	Completado
Extensión de sistema de distribución del pozo Jauca	Con este proyecto se apagó pozo de Santiago Apóstol y se mejoro sistema de Jauca	Completado (Ahorro Energético)

RENOVACIÓN Y EXTENSIÓN DE TUBERÍAS SANTA ISABEL

Proyecto	Descripción	Estatus
Sistema deficiente residencias cercanas al bombeo de las "Booster" de Paso Seco	Instalación de 560' de tubería pvc 4" con cuatro acometidas nuevas.	85% (falta conexión de tubería 8")

PROYECTOS DE EMERGENCIA SISTEMA SANITARIO – SANTA ISABEL

Proyecto	Descripción	Estatus
Renovación de Tubería en Casco Urbano de Santa Isabel	Remoción y renovación de 713 pies de tubería de 8" existente en material PVC y Hormigón por tubería de 12" en PVC SDR-35	Completado
Renovación de Tubería en Calle Ruíz Belvis	Remoción y renovación de 530 pies de tubería de 8" existente en material PVC y Hormigón por tubería de 12" en PVC SDR-35	Construcción (50%)

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA VILLALBA

Proyecto	Estatus	Inversión Estimada
Villalba Potabla Water Filter Plant Completion Project (Toa Vaca)	Construcción (20%)	$ 3,939,859.00
Construcción de Mejoras a Varios Tanques del Área Operacional de Coamo	Construcción (40%)	$ 337,970.00
Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Filtros de la Planta de Filtración Jagüeyes	Completado	$ 361,000.00
Compra e Instalación de tres (3) generadores de emergencia en EB Aceitunas II, III y IV	Entregados y en Funcionamiento	$284,678.00
STS Fase II	Diseño	N/A

PROYECTOS REALIZADOS VILLALBA

Proyecto	Descripción	Estatus
Mejoras para aplicación y almacenaje de productos químicos Aceitunas	Construcción de diques, compra e instalación de tanques de almacenaje y equipos de inyección	40% Construido
Proyecto de Aplicación de Bisulfito en la Planta Filtros Toa Vaca	Neutralización de Cloro en la descarga 001	Completado

RENOVACIÓN Y EXTENSIÓN DE TUBERÍAS VILLALBA

Proyecto	Descripción	Estatus
Relocalización tubería de distribución de 2" en el sector La Ortiga	Se relocalizó tramo de 240 pies de tubería pvc de 2"	Completado

PROYECTOS DE EMERGENCIA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN – VILLALBA

Proyecto	Descripción	Estatus
Skid de Bomas y Bombas Booster para la Aplicación del Oxidante	Instalación de tubería en stainless steel. Remplazo de material existente.	Completado

ÁREA OPERACIONAL DE COAMO
MODELAJES HIDRÁULICOS

Sistema	Descripción	Estatus
Sistema de Distribución Sabana Orocovis	Estudio para determinar el balance de agua disponible. en el sistema Se pretende optimizar el sistema con las recomendaciones obtenidas.	90% Completado
Sistema de Distribución Mata de Caña Orocovis	Estudio para determinar el balance de agua disponible. en el sistema Se pretende optimizar el sistema con las recomendaciones obtenidas.	90% Completado
Sistema de Distribución El Gato Orocovis	Estudio para determinar el balance de agua disponible. en el sistema Se pretende optimizar el sistema con las recomendaciones obtenidas.	90% Completado
Sistema de Distribución Pozos de Paso Seco, Santa Isabel	Estudio para determinar el balance de agua disponible. en el sistema Se pretende optimizar el sistema con las recomendaciones obtenidas.	95% Completado
Sistema de Distribución Planta Ultrafiltración Toa Vaca, Villalba	Estudio para determinar el balance de agua disponible. en el sistema Se pretende optimizar el sistema con las recomendaciones obtenidas.	95% Completado

ÁREA DE GUAYAMA

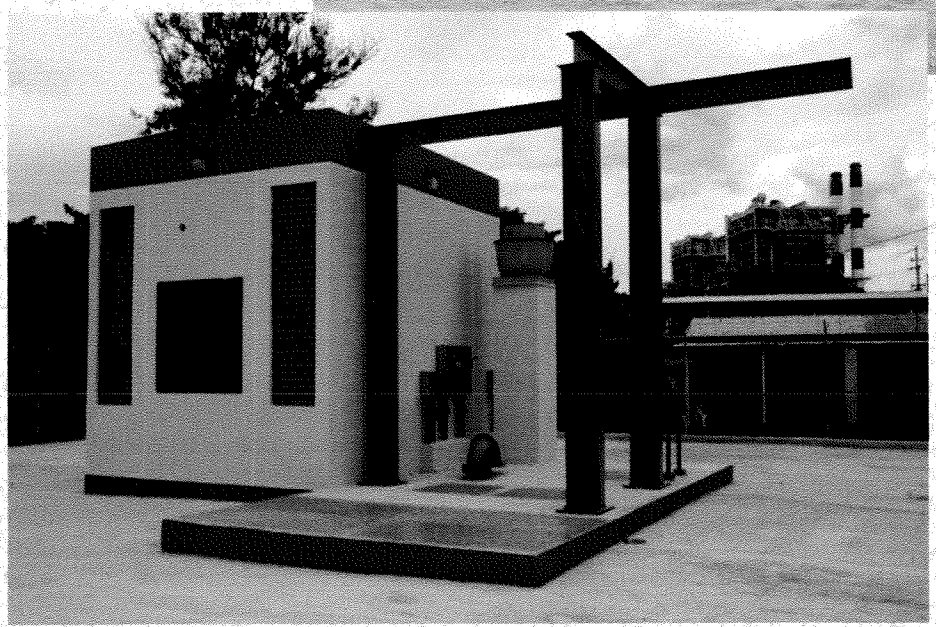

PROYECTOS DE OBRA MENOR MUNICIPIO DE ARROYO

Proyecto	Descripción	Estatus
Interconexión tubería Arroyo	Interconexión de tubería de tanque de distribución siete millones de galones al sistema de distribución de Guayama- Arroyo	Adjudicado- Gama Eng
Tanque Los Morales en Arroyo	Operación beneficia a comunidad Los Morales en este municipio	Completado
Rehabilitación y mejoras a tanques de la región.	El Piojo, Jácanas I, II y III; TK y EB Jácanas I, TK Jácanas II, TK Jácanas III, TK Antigua I (II), TK Antigua II (Antigua Final), TK Sierrita I, TK Sierrita II, TK Bda. Marín, TK Palmarejo, TK El Piojo, Tk Palmas (Cuadrado), TK Palmas (Circular)	Adjudicado MC Solutions
Rehabilitación y reemplazo de tubería sanitaria	393 metros lineales e instalación de 25 acometidas	Planificación- $149,412

PROYECTOS DE OBRA MENOR
ÁREA DE GUAYAMA

Proyecto	Descripción	Estatus
Cumplimiento/Guayama	WTP- Guayama Urbano/ Cumplimiento	Construcción
Mejoras oficinas área de Guayama	Mejoras a caseta de seguridad y planta física del Centro de Operaciones, Área de Guayama	Terminado
Proyecto sector Santos Morales, Carite en Guayama	Diseño y construcción de sistema hidroneumático en el sector Santos Morales en el barrio Carite.	Terminado
Troncal Patillas-Guayama	Construcción de troncal Patillas-Guayama del sistema de alcantarillado sanitario	Planificación
Rehabilitación y mejoras a tanques de la región.	Tanque Arroyo, Tanque Guayama, Tanque Lavado PF Guayama, ,Tanque Redondo 2 millones, Tanque Palmas I nuevo , Tanque Palmas I viejo, Tanque Palmas II , Tanque Palmas III , Tanque Palmas IV, Tanque Caimital II, Tanque Caimital III , Tanque Olimpo Viejo, Tanque Pueblito del Carmen I (viejo) , Tanque Pueblito del Carmen II (grande), Tanque Pueblito del Carmen II peq. , Tanque Punta Brava (nuevo), Tanque el Vigía I , Tanque el Vigías II , Tanque Corazón I, I/2 millón , Tke Corazón II , Tanque Corazón Vietnam, Tanque Corazón III, El Húcar , EB Rexmanor	Planificación Ámbito

PROYECTOS
OBRA MENOR
ÁREA DE GUAYAMA

Proyecto	Descripción	Estatus
Tanque Los Morales en Arroyo	Operación beneficia a comunidad Los Morales en este municipio	Completado
Tanque Emajagua	Provee servicio de agua a residentes en comunidad Emajagua en Maunabo	Completado
Planta de Filtros Matuyas	Esta planta beneficia al barrio Matuyas y Fantauzi en Maunabo y al barrio Los Ríos en Patillas	Completado
Mejoras al tanque de dos millones en Guayama	Este tanque suple a la parte Este del pueblo de Guayama, al igual que el bario Mosquito entre Guayama y Salinas.	Completado
Mejoras al tanque Salinas Urbano	Este tanque beneficia al casco urbano de Salinas y a los sectores Playa y Los Ochenta de este municipio.	Completado
PAS Patillas- Diseño clarificador primario a tanque de aereación para manejo de lodos	Trabajos permiten mantener operación óptima de estas instalaciones para el manejo y disposición de aguas usadas.	Completado
PAS Patillas- Centrífuga para el manejo de lodos húmedos	Trabajos permiten mantener operación óptima de estas instalaciones para el manejo y disposición de aguas usadas.	Completado
Instalación de tubería sanitaria en Urb. Rexmanor en Guayama; calle Baldorioty en Salinas y mejoras troncal Branderí EBAS	Mejoras al manejo y disposición de aguas usadas	Completado
Instalación del sistema de alcantarillado sanitario en Aguirre, Salinas.	Elimina sistema antiguo que no era de la AAA por uno de recogido adecuado de aguas usadas.	Completado

RENOVACIONES DE TUBERÍAS- ENERO A JUNIO DE 2012

Área de Guayama	Longitud de tubería	Periodo
Renovación de tuberías de agua potable	1,506.1 metros lineales en Bo. Palmas (Sunset Park) en Arroyo, Bo. Cacao Alto (Los Fugueroa) en Patillas; Bo. Bajos (Cintrón) en Patillas; Finca La Carmen en Salinas; sector Fondo del Saco (Calle San José) y Calle José Elías Bellón en Guayama.	Julio a diciembre de 2012 Completado
Renovación de tubería del sistema de alcantarillado sanitario	190 metros lineales en calle Carpenter y Unión en Salinas.	Febrero de 2012. Completado

PROYECTOS
MUNICIPIO DE MAUNABO

Municipio	Proyecto	Etapa
Maunabo	Nueva planta urbana de alcantarillado sanitario 1.0 mgd	En Operación
Maunabo	Rehabilitación toma de aguas crudas y embalse PF Lizas	Construcción
Maunabo	Terminación - Mejoras al sistema de distribución de agua potable Comunidades Palo Seco.	En Operación
Maunabo	Terminación - Mejoras al sistema de distribución de agua potable Comunidades Calzada, Los Lebrones [clorinación y conexión cliente] y Los Sánchez, 3-20-7005 [coordinación AEE]	Construcción
Maunabo	Reemplazo de tubería, reemplazo y relocalización de acometidas de servicio en la PR-901 Sector Mariani, Bo. Emajagua	Subasta
Maunabo	Rehabilitación y mejoras a tanques de la región. Tk Leones y Marcial, TK Palo Seco, TK Talante, TK Pica I, TK Pica II, TK Emajagua I, TK Mariani, TK Bordaleza	Adjudicado MC Solutions
Maunabo	Mejoras Pozos Maunabo: parcelas, verja y otros. (Encuesta Sanitaria)	En Ámbito
Maunabo	Mejoras tanques Mariani, Emajagua I, Emajagua II y Bordaleza: cambio escoltillas, acceso, loza hormigón, verjas, boyas, sistema trolley, empañetado y resanado y otros. (Encuesta Sanitaria)	En Operación
Maunabo	Rehabilitación de lechos de secado del sistema de tratamiento de cienos en PF Lizas	Construcción

PROYECTOS
MUNICIPIO DE MAUNABO

Municipio	Proyecto	Etapa
Maunabo	Conexión de tubería de desague del Pozo Urbano al sistema de alcantarillado sanitario.	Planificación
Maunabo	Rehabilitación de EB, remoción y disposición de facilidades eléctricas eliminadas y reemplazo de viga de troley en EB y Tanque Pica 3	Terminado
Maunabo	Instalación de tubería de agua potable de 6" en Bo. Matuyas	Planificación
Maunabo	Mejoras a la toma de aguas crudas en PF Lizas	Construcción
Maunabo	Proyecto Automatización PF Lizas	Construcción

PROYECTOS
MUNICIPIO DE PATILLAS

Municipio	Proyecto	Etapa
Patillas	Nueva WTP, Capacidad 6.0 MGD - Fase I	Construcción
Patillas	Troncal Patillas - Guayama	Planificación
Patillas	Acuerdo Municipio Patillas: Instalación de 1,180ml tubería gravedad PVC 8-, 25 registros, EB, 516 ml línea de fuerza de 4-, 83 acometidas y demolición EB existente Sector Playa, Barrio Bajos	En Operación
Patillas	Reemplazo tanque en acero de 10,000 gal Bo. Cacao Alto, Sector Los Laboy Tk La Luna	En Operación
Patillas	Construcción de interconexiones entre la línea de distribución de 24" y 30" y el sistema de agua de Patillas y Arroyo e instalación de válvulas de control [COTEJAR]	Planificación
Patillas	Mejoras a EB Marin 4, estación de bombas verja, loza y muro de retención	Construcción
Patillas	Diseño y Construcción de EB soterrada y demolición de EB y tanque 3 Puntos	Planificación
Patillas	Reemplazo de 1,000 p de tubería de 8" en PVC por tubería ductil iron desde EB Felicita hasta el Bo. Palmas	Planificación
Patillas	Instalación de 600p de tubería de 4" en el Sector Casillas del Bo. Marín Bajo.	Completado
Patillas	Rehabilitación y mejoras a tanques de la región. TK Patillas Urbano (500,000), TK y EB Marín Alto I, TK y EB Marín Alto II, TK y EB Marín Alto III, TK Egozcue, TK Apeadero, TK Mamey, TK y EB Laboy (Cilíndrico), TK Jagual, TK Los Pollos 100K (Viejo), TK Los Pollos 70K (Nuevo), Tk Lamboglia	Adjudicado MC Solutions

PROYECTOS
MUNICIPIO DE SALINAS

Municipio	Proyectos	Etapa
Salinas	Sistema acueducto com. Aguirre y Montesoria	En Operación
Salinas	Instalación del sistema sanitario Comunidad Cocos, incluye cierre pozo septico Arcadio Maldonado (Requiere el proyecto 3-64-5030 para ser operable)	Construcción
Salinas	Sistema alcantarillado comunidad Aguirre y Montesoria	En Operación
Salinas	Troncal sanitaria Cocos desde PR 1 hasta troncal sanitaria Salinas Guayama PR 3, Fase I (ver 3-64-5001)	En Operación
Salinas	Mejoras Pozo Las Margaritas: parcela, generadores de emergencia, construcción verja hormigón y portón	Terminado
Salinas	Diseño y Construcción de Sistema de Distribución de Agua Potable en Carr. PR 707 Sector Brisas de Salinas	Subasta
Salinas	Construcción de Sistema de Distribución de Agua Potable para Residencial Modesto Cintrón, Salinas	Se realizara por la Comercial
Salinas	Construcción de Sistema Agua Potable de Villa Esperanza	Construcción
Salinas	Rehabilitación y mejoras a tanques de la región. TK Vertero, TK Coco I, TK Coco II, TK La Plena, TK Pilín Circular, TK Pilín Rectangular, TK Palmas II, TK Palmas III TK Parcelas Vázquez, TK Vertero Final, TK Cerrito	Adjudicado MC Solutions

INFRAESTRUCTURA

- 47 proyectos activos en la Región

- Planificación (5):
  - Coto Laurel
  - Ponce Vieja
  - Ponce Nueva
  - I/I Yauco
  - Toa Vaca – Reemplazo de Membranas

- Diseño (5):
  - Troncal Patillas-Guayama
  - El Gato Fase 2
  - Rehab. Troncal Fase 2 – Ponce
  - Terminación Yauco WWTP
  - LT2 – PF Sabana Orocovis

- Subasta (4)
  - Tanque de 4MG Ponce Vieja
  - Mejoras Orocovis WWTP
  - Edificio de Operaciones
  - D/B Linea Sanitaria y Agua Potable Calle 25 de julio

- Construcción (15)

- Cierre (18)

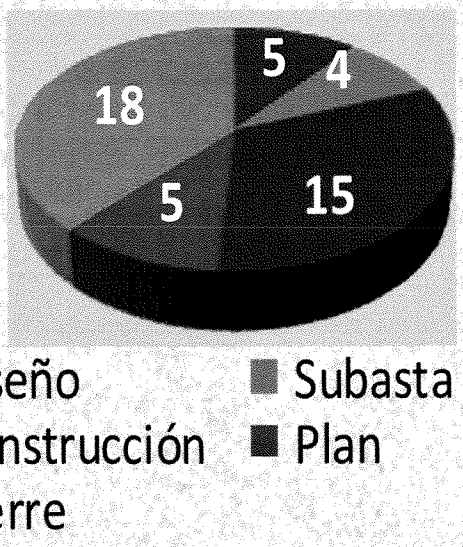

ESTATUS PROYECTOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

- STS Región Sur
- Mejoras PF Guayama, Cumplimiento
- D/B for bridge & RWI at Patillas WFP
- Sistema Sanitario Cocos II, Salinas
- Yauco WFP
- Terminación Planta de Filtros Yahuecas
- PF Lizas
- Ponce en Marcha
- Ponce Digestores
- Aireación Toa Vaca
- Villalba WTP – Completion of Project
- Terminación Juan Díaz – Coamo
- Mejoras al sistema de cieno de PAS Peñuelas
- D/B Mejoras a filtros Real Anón
- El Gato Fase 1

D/B for Bridge & RWI at Patillas WFP

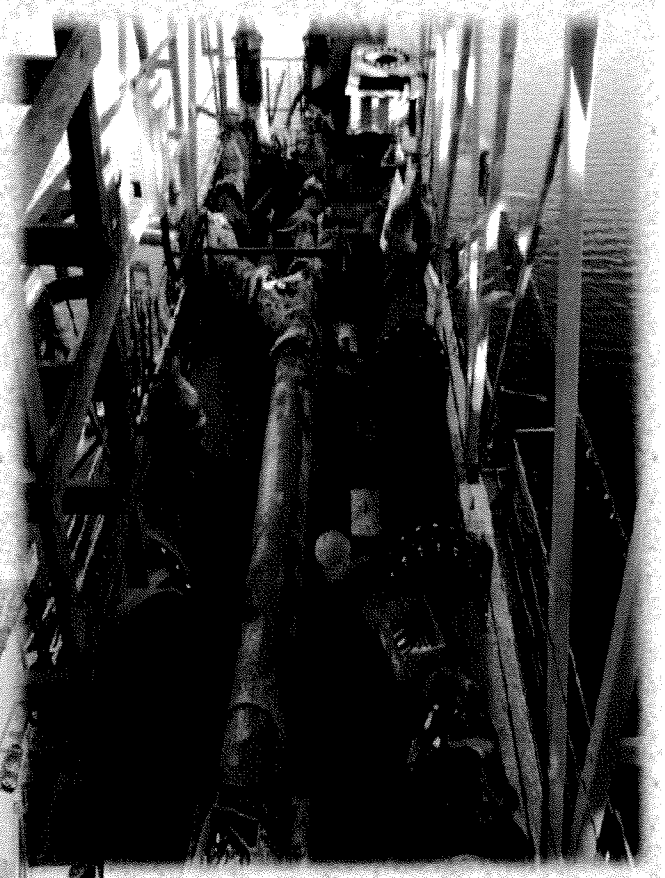

- Construcción: **65%**

Costo Revisado
$ 564,184.00

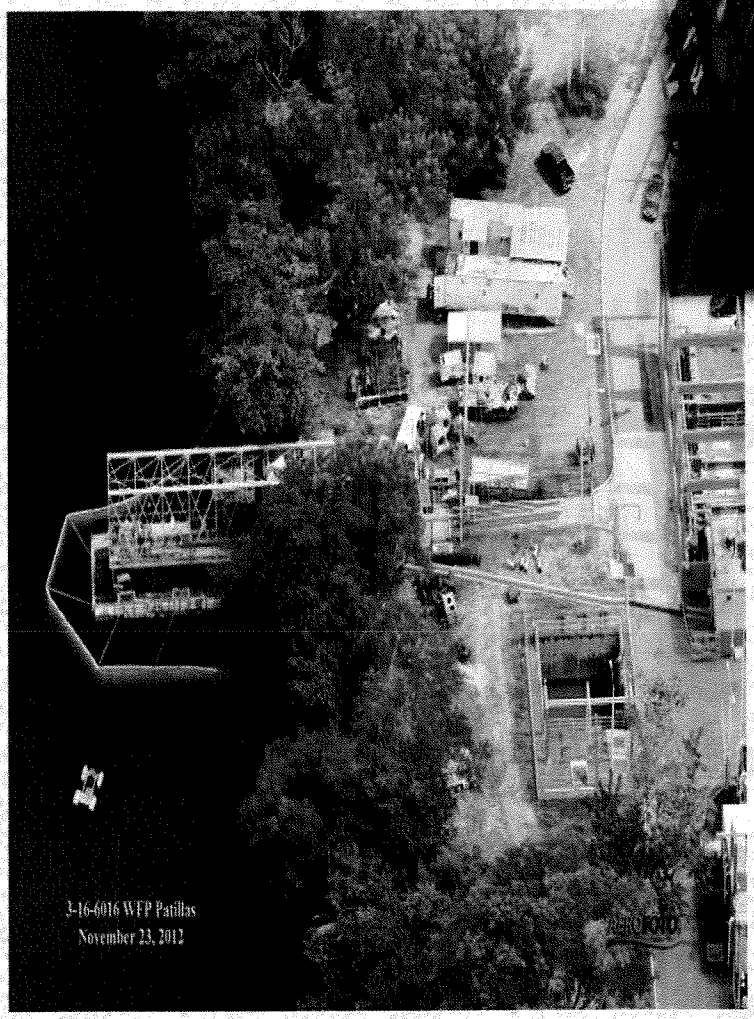

Sistema Sanitario Cocos II, Salinas

- %Completado: **33%**

- Hasta la fecha se han instalado 450 registros sanitarios de un total de 500, 1008 acometidas de un total de 2146 y 6,720 metros lineales de tubería sanitaria de un total de 31,960 metros.

Costo
$9,108,000.00

Nueva Planta de Filtros de 6-MGD Yauco, Fase I

- Construcción: **80%**

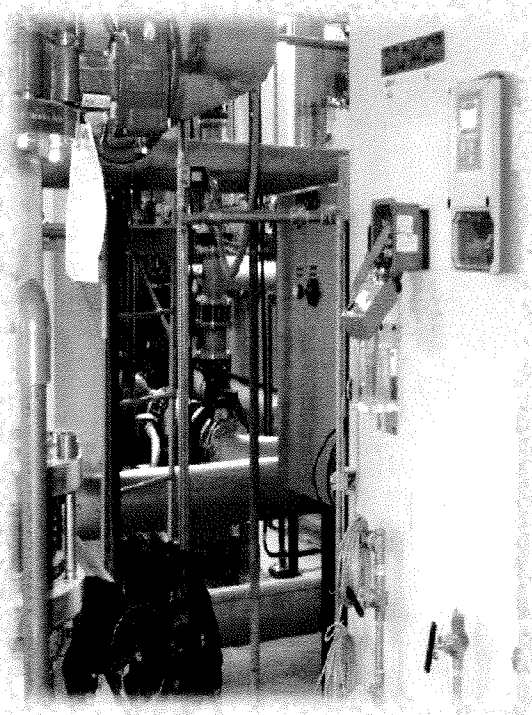

- Se finalizaron los trabajos de desinfección del sistema y se colocó en operación la parte aguas arriba de la Planta.
- Se trabajan detalles finales en la integración e instrumentación.
- Se continúa la construcción de los lechos de secado y otros trabajos que se pueden adelantar de la Fase II.

Costo Revisado
$19,894,060.48

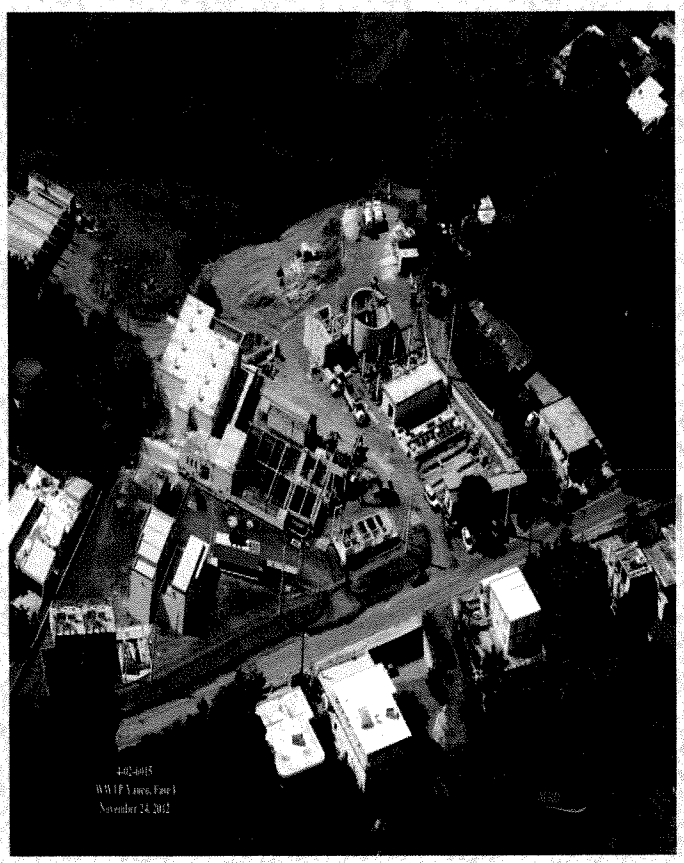

Terminación Planta de Filtros Yahuecas, Adjuntas

- Construcción: **66%**

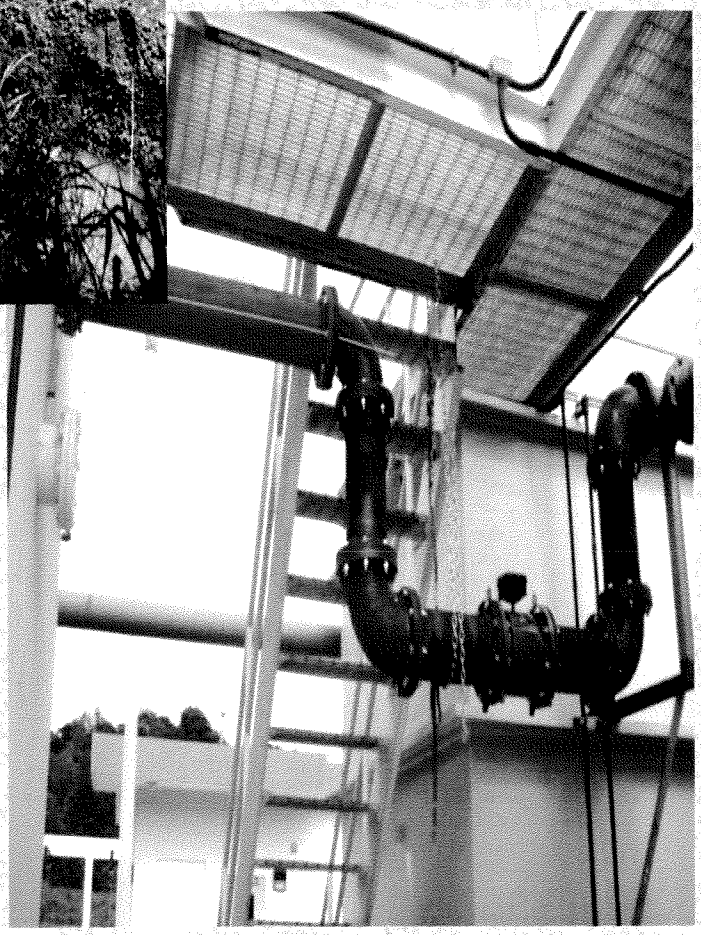

Ponce en Marcha Fase III
Acueductos / Alcantarillado

- Construcción: **85%**

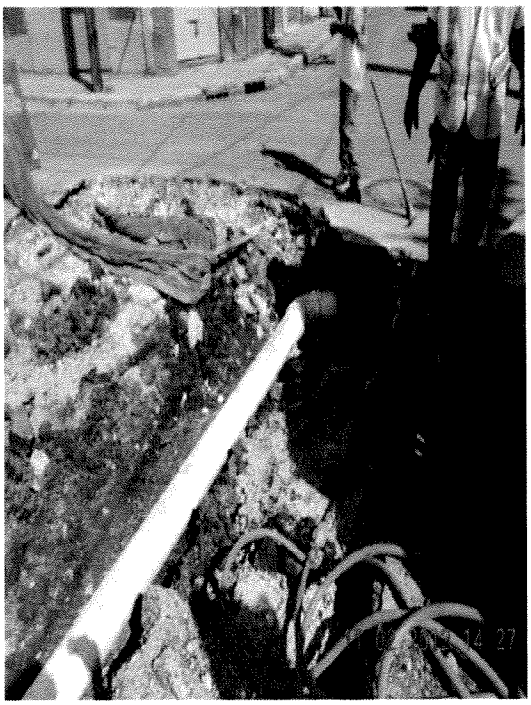

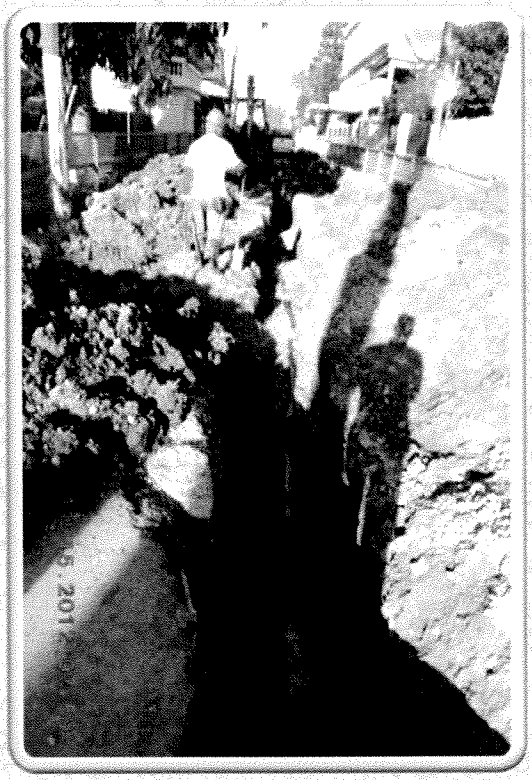

	Costo Revisado
Acueducto	$889,969.96
Alcantarillado	$1,035,758.42

Rehabilitation of Anaerobic Digesters No. 1 & No. 2 in the Ponce WWTP

- Construcción: **90%**

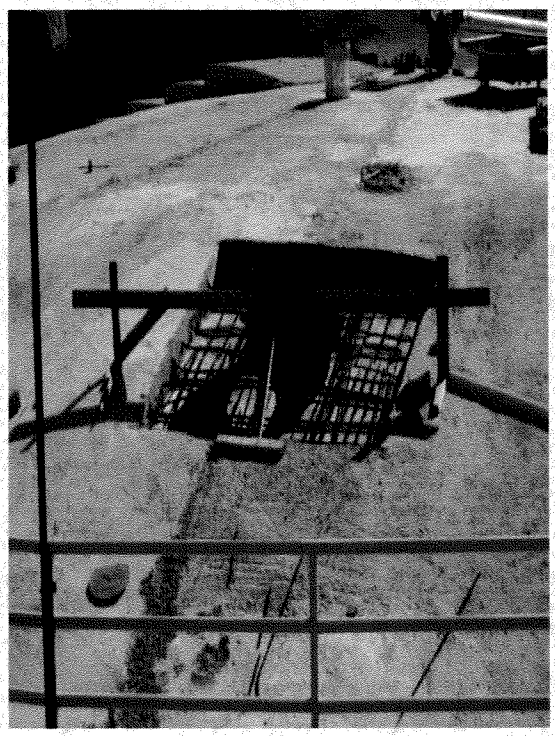

Costo Revisado
$2,095,100.00

Aireación Toa Vaca

- Construcción: **98%**

- Todos los difusores, 18 en total, se encuentran en operación desde el 15 de noviembre de 2012. Actualmente el lago se encuentra en el periodo de restauración y se estará sometiendo el primer reporte a la JCA 30 días después de la fecha de puesta en operación de los difusores.
- Entre los trabajos restantes de construcción se encuentra la protección de la transición de las tuberías de aire en al entrar al Lago en caso de vandalismo o fuego forestal y el "grading" de la caseta de aereación de los pescadores.

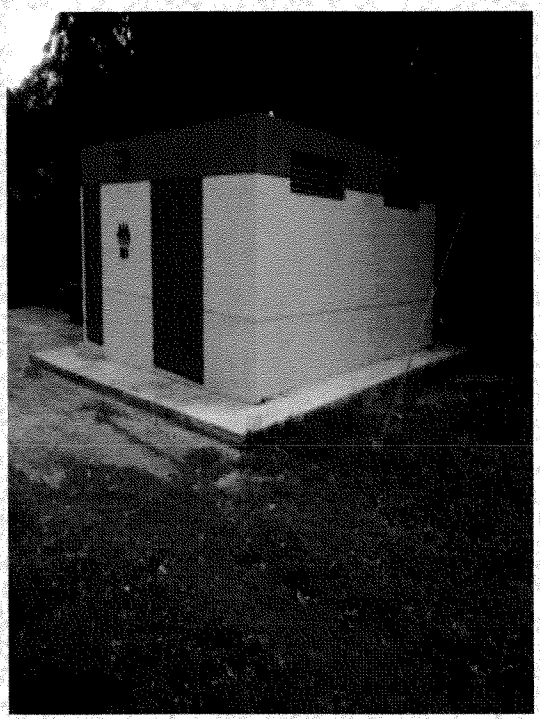

Costo Revisado
$1,490,851.00

Línea de Transmisión Sistema Juana Díaz – Coamo

- Construcción: **34.39%**

- La instalación de la tubería de 16" de salida del Tanque de 2.5MG fue instalada en su totalidad.

Costo Revisado
$2,592,078.41

Sistema Sanitario Fase I para los Barrios El Gato y Orocovis [ARRA]

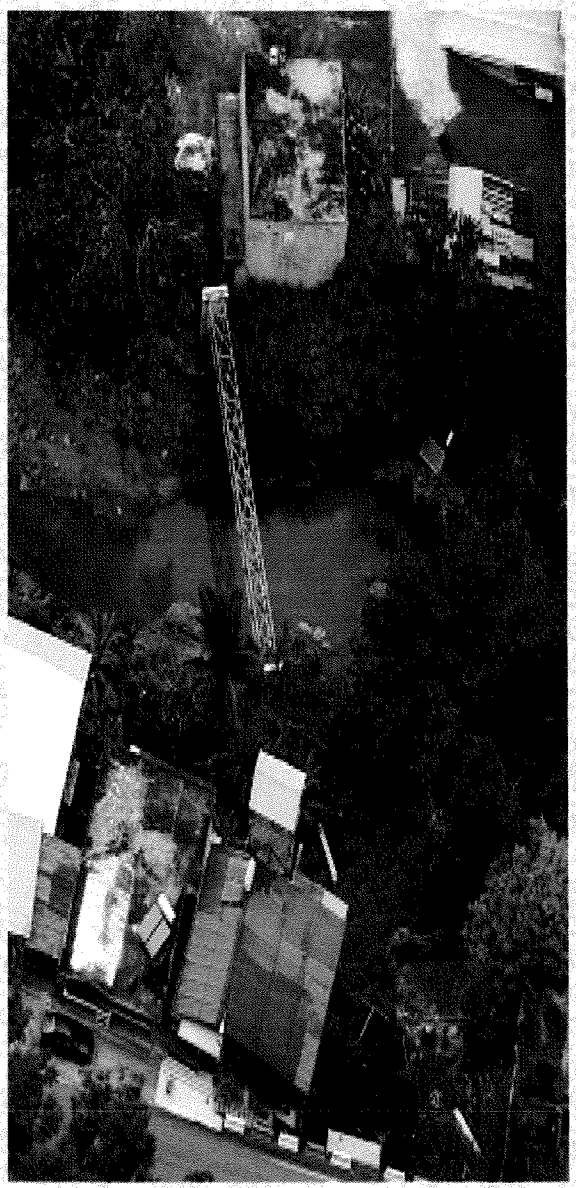

- Construcción: 50%
- Se anticipa reanudar este proyecto a principios del 2013.

Costo Revisado
$2,882,129.47

Proyectos Etapa de Planificación

Coto Laurel (PER)
Ponce Vieja (PER)
Ponce Nueva (PER)
Toa Vaca – Reemplazo de Membranas
I/I Yauco

Proyectos en Etapa de Diseño

Troncal Patillas-Guayama
El Gato Fase 2
Rehab. Troncal Fase 2 – Ponce
Terminación Yauco WWTP
LT2 – PF Sabana Orocovis

Proyectos Etapa de Subasta

Mejoras Orocovis WWTP
Tanque de 4MG Ponce Vieja
Edificio de Operaciones
D/B Línea Sanitaria y Agua Potable Calle 25 de julio

Proyectos Etapa de Planificación 2013

•"Preliminary Engineering Report" para las mejoras la PAS Peñuelas.

•"Preliminary Engineering Report" para las mejoras la PAS Guayanilla.

•Mejoras a la PAS de Santa Isabel

•Evaluación Tubería de Aguas Crudas de Toa Vaca a Ponce Vieja.

Proyectos Relevantes en las fases de Post-Construcción y Cierre

PAS Guánica, Mejoras Adicionales, Guánica

Construcción: **99%**

Sistema Sanitario Comunidad Arturo Lluberas Design/Build, Yauco

Costo Revisado
$524,337.03

Sistema de Agua Potable La Jurada y La Jalda del Río, Yauco [ARRA]

- Completado, en proceso de cierre

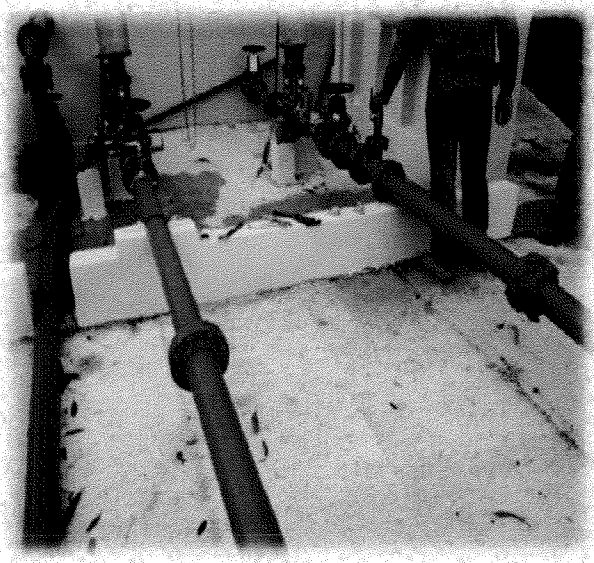

Costo Revisado
$1,419,981.00

Terminación sistema de agua potable para las comunidades de Calzadas, Los Lebrones y Los Sánchez, Municipio de Maunabo

Completado

Mejoras a la PAS Yauco

Completado

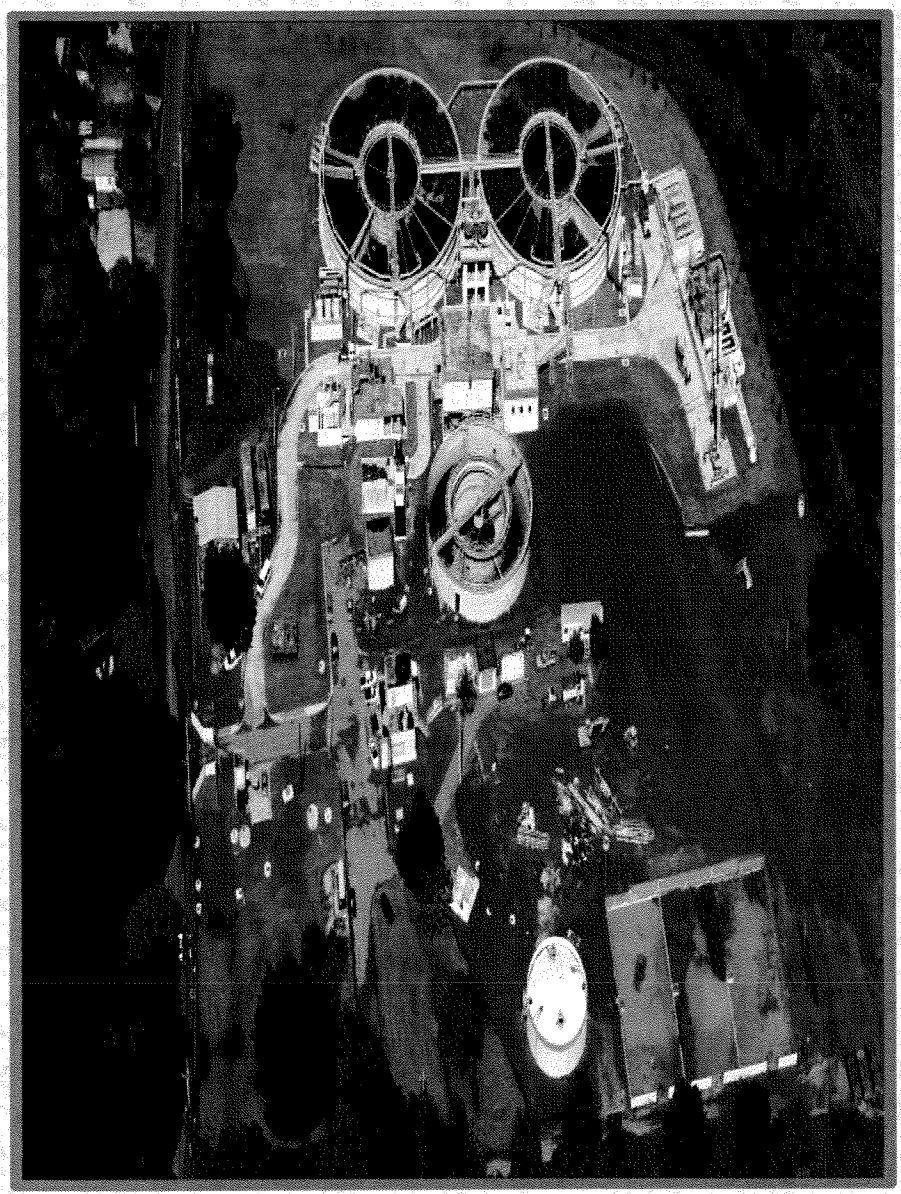

Planta de Filtración 6-MGD, Patillas

Planta de Aguas Sanitarias, Maunabo

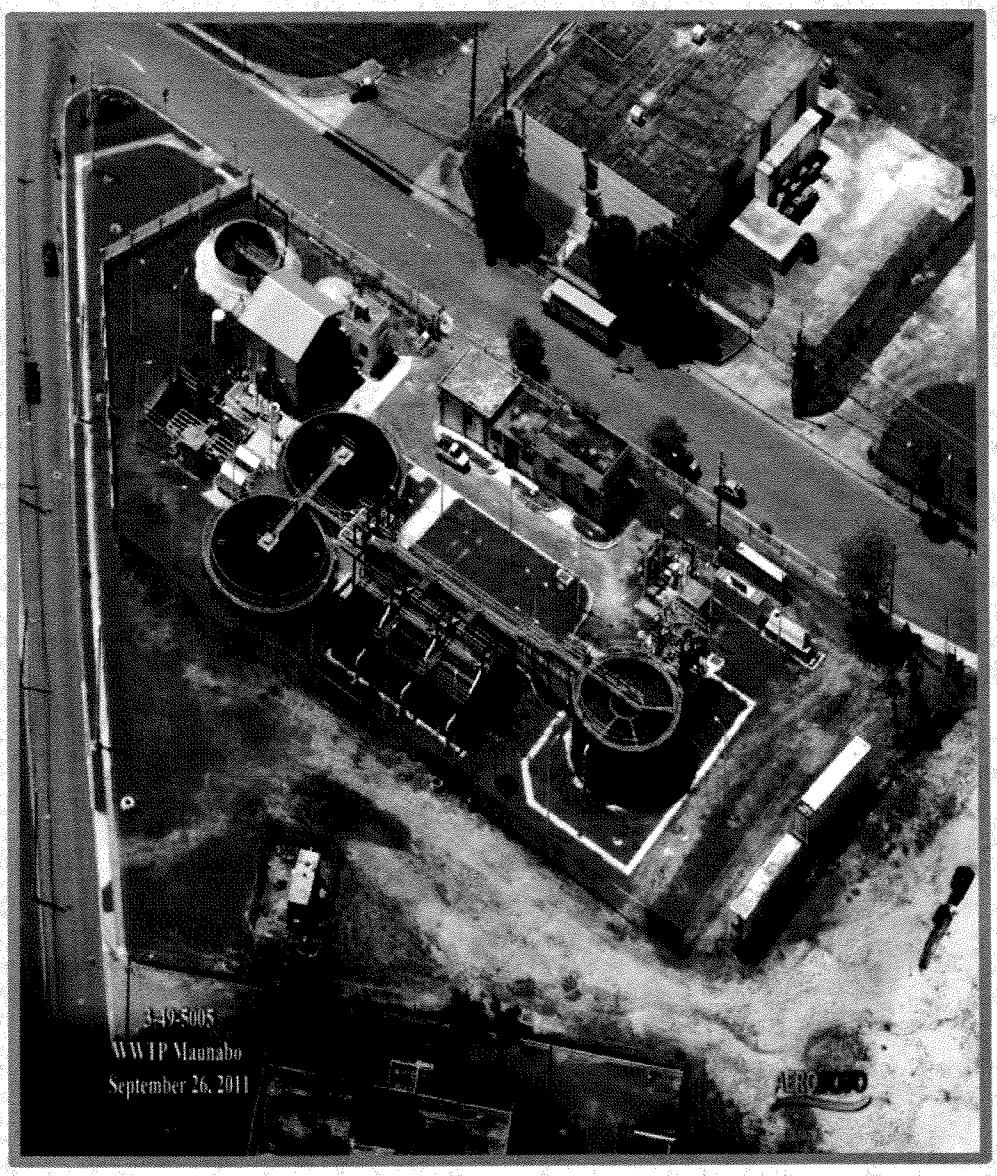

Proyectos Obra Menor Región Sur

- Construcción

- Pre Construcción

- Procedimiento 400 (Subasta MAE)

- Planificación

- Cierre

Rev. @ 19 de diciembre de 2012

Proyectos Obra Menor en Construcción

Área Operacional de Guayama

Diseño y Construcción para Rehabilitación de Estación de Bombas y Tanque Marín 4, Patillas

- % Construcción: 75.00 %

El proyecto propone el diseño y construcción para las mejoras y rehabilitación de la Estación de Bombas y Tanque Marín 4. Las mejoras incluyen rehabilitación de la parcela, construcción de losa de hormigón, instalación de verja eslabonada en el perímetro, reemplazo de bombas, motores, válvulas, líneas de salida, construcción de muro de contención, reemplazo de panel de control, remplazo de subestación eléctrica.

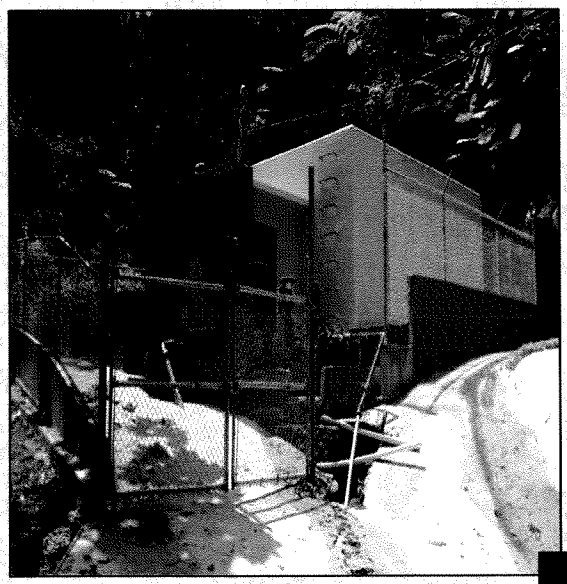

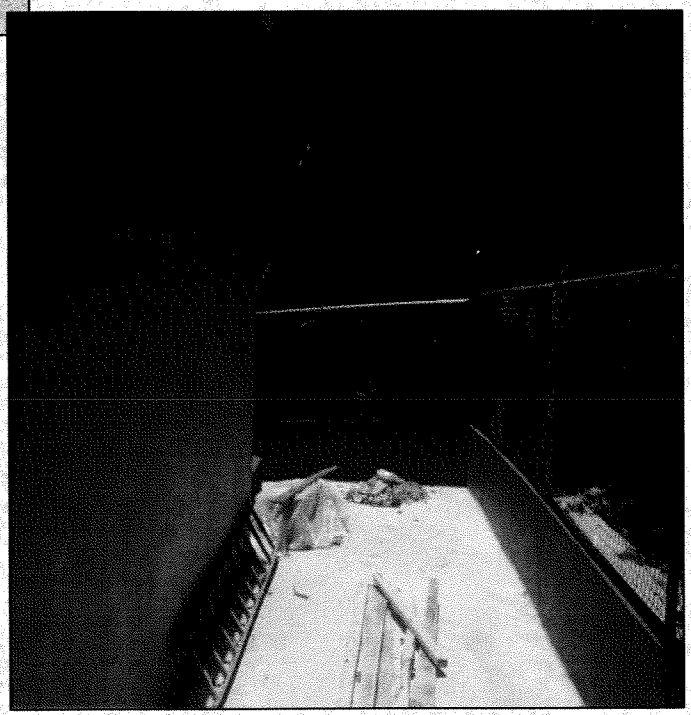

Proyectos Obra Menor en Construcción

Área Operacional de Coamo

Construcción de Mejoras a Tanques del Área Operacional de Coamo, Coamo,

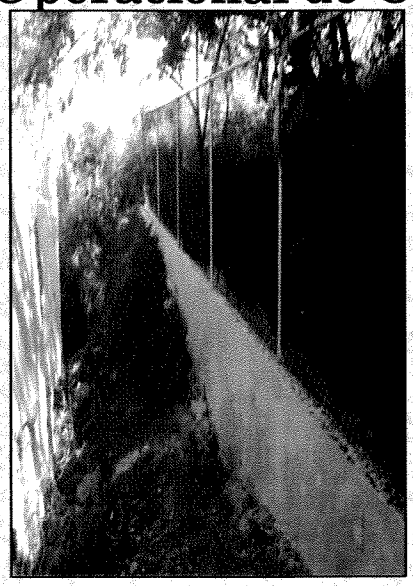

- % Construcción: 34.00 %
- Descripción:

  El proyecto propone mejoras a los tanques del Área Operacional de Coamo, la cual comprende los Municipios de Santa Isabel, Coamo, Villalba, Orocovis y Coamo. Las mejoras propuestas consisten en mejoras a casetas de boyas, reemplazo de verjas y puertas, mejoras y construcción de caminos de acceso, sustitución de escotillas de acceso a tanques, construcción de escaleras de acceso y construcción de muros de contención.

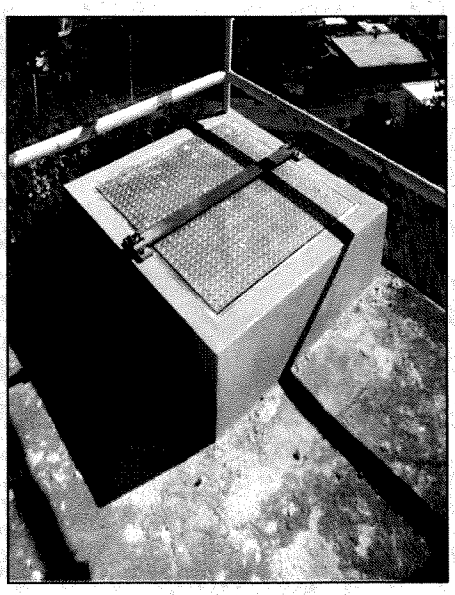

Monto Contrato	Órdenes de Cambio	Monto Revisado Contrato
$337,900.00	$0.00	$337,900.00

Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Filtros de la Planta de Filtración Matrullas, Orocovis,

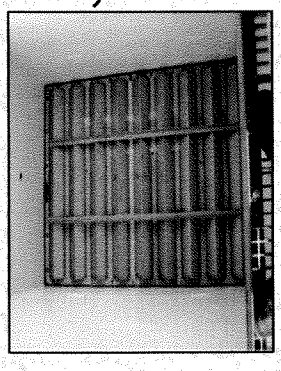

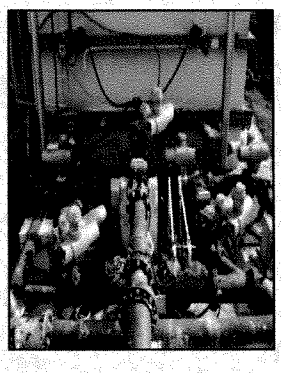

- % Construcción: 90.00 %
- Descripción:

  El proyecto propone el diseño y construcción para las mejoras al sistema de filtros de la Planta de Filtración Matrullas. Dichas mejoras incluyen la sustitución del medio filtrante, instalación de nuevo sistema de "under drains" y nuevo sistema de "blowers" para optimizar el lavado superficial de los filtros, a la vez que se estarán corrigiendo los señalamientos realizados por las agencias reguladoras.
- Trabajos:

  Los trabajos están realizados en un 90.00 %. Los trabajos en los filtros están completados al igual que los trabajos del sistema de "blowers". Queda pendiente finalizar la programación de los sistemas.

PROYECTO SUSTANCIALMENTE COMPLETADO

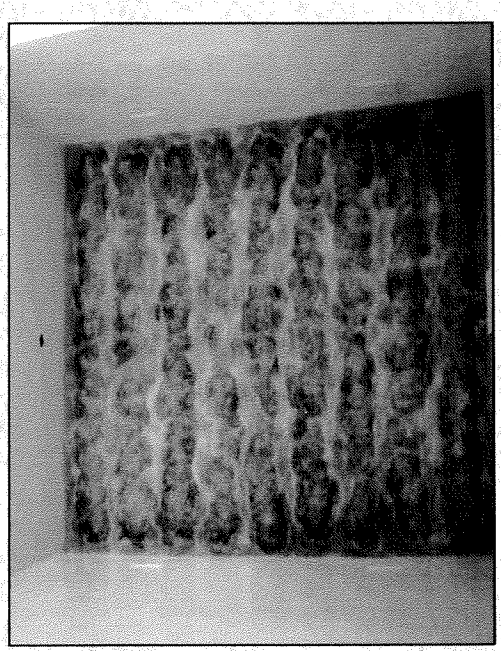

Monto Contrato	Órdenes de Cambio	Monto Revisado Contrato
$347,960.00	$0.00	$347,960.00

Diseño y Construcción para Mejoras a Sistema de Filtros en Planta de Filtración Jagüeyes, Villalba

- % Construcción: 70.00 %
- Descripción:
  El proyecto propone el diseño y construcción para las mejoras al sistema de filtros de la Planta de Filtración Jagüeyes. Dichas mejoras incluyen la sustitución del medio filtrante, instalación de nuevo sistema de "under drains" y nuevo sistema de "blowers" para optimizar el lavado superficial de los filtros, a la vez que se estarán corrigiendo los señalamientos realizados por las agencias reguladoras.
- Trabajos:

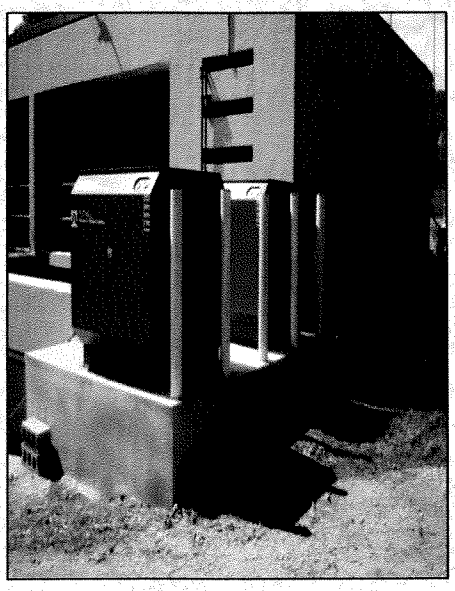

Monto Revisado Contrato
$393,877.41

Diseño y Construcción para Mejoras a Sistema de Filtros en Planta de Filtración Coamo

- % Construcción: 5.00 %

- Descripción:
  El proyecto propone el diseño y construcción para las mejoras al sistema de filtros de la Planta de Filtración Coamo. Dichas mejoras incluyen la sustitución del medio filtrante, instalación de nuevo sistema de "under drains" y nuevo sistema de "blowers" para optimizar el lavado

Monto Contrato	Órdenes de Cambio	Monto Revisado Contrato
$487,905.00	$0.00	$487,905.00

Proyectos Obra Menor en Construcción

Área Operacional de Ponce

Construcción de Mejoras a Tanques del Área Operacional de Ponce

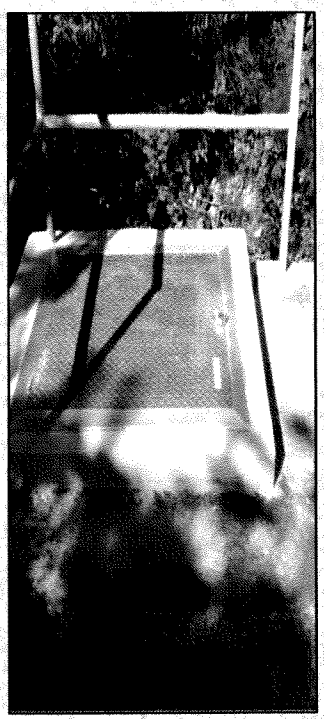

- % Construcción: 83.00 %
- Descripción:

  El proyecto propone mejoras a Ponce, la cual comprende los Municipios de Adjuntas y Ponce. Las mejoras propuestas consisten en sellado de tanques, mejoras a casetas de boyas, reemplazo de verjas y puertas, mejoras y construcción de caminos de acceso, sustitución de escotillas de acceso a tanques, construcción de escaleras de acceso y construcción de muros de contención.
- Trabajos:

  Contratista completó los trabajos en los tanques Olimpia, Lavado Olimpia, Paraíso Nuevo, Paraíso I, Baramaya, Gravedad PF Ponce Vieja, Tuque II, Pit EB del Monte, Clearwell PF Olimpia, Paraíso II, Guayo I, Guayo II, Guayo III, Guayo IV, Pedro, Santas Pascuas, Corral Viejo Cuartel (Hogares Seguros), Grande PF (Hogares Seguros), Mocha III, Brisas II, 4ta Extensión del Monte Redondo, Ausubos I, Ausubos II y Baerga.

Monto Contrato	Órdenes de Cambio	Monto Revisado Contrato
$498,000.00	$0.00	$498,000.00

Proyectos Obra Menor en Construcción

Área Operacional de Yauco

Construcción para Mejoras a Estacion de Alcantarillado Sanitario (EBAS) Río Sol, Peñuelas

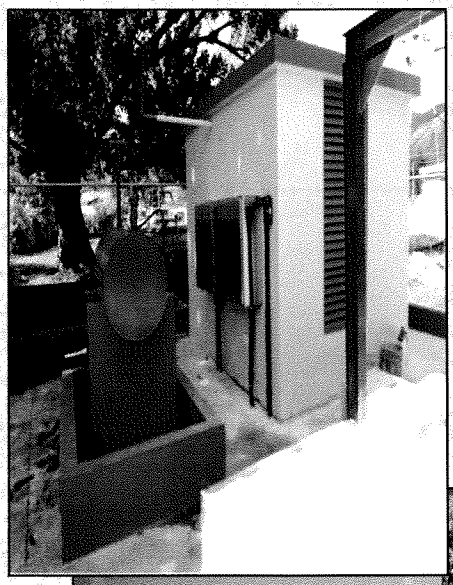

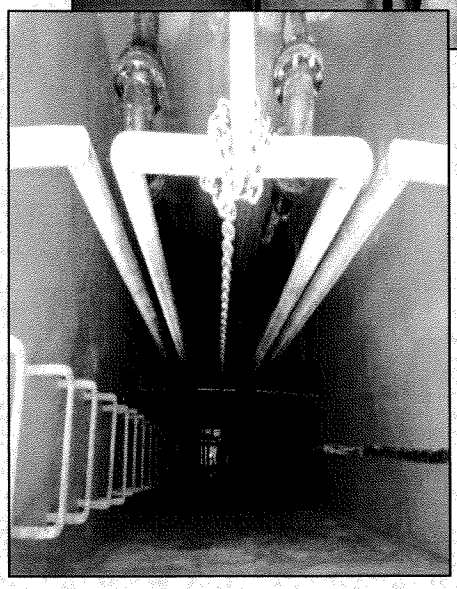

- % Construcción: 85.00%
- Descripción:

  El proyecto propone la construcción de mejoras a la EBAS Río Sol, lo que incluye el remplazo e instalación de la tubería de descarga y ambas bombas, remplazo e instalación de guías y cadenas, rehabilitación de los pocetos, rehabilitación de la parcela que incluye construcción de una losa de hormigón, verja eslabonada en dos lados de la parcela y pintura interior y exterior de la caseta de controles, instalación de nuevo panel de controles y una serie de mejoras civiles, mecánicas y eléctricas para la EBAS.
- Trabajos:

  Trabajos realizados en un 85%, pendiente trabajos en área de portón de acceso, instalación de una bomba sumergible y finalizar pruebas de rotación y funcionamiento de bombas.

Monto Contrato	Órdenes de Cambio	Monto Revisado Contrato
$153,458.00	$0.00	$153,458.00

Construcción de Mejoras a Estación de Bombas Jagua Tuna, Guayanilla

- % Construcción: 55.00 %
- Descripción:

  El proyecto propone la construcción de mejoras a la Estación de Bombas Jagua Tuna en Guayanilla. Estas mejoras incluyen remplazo de dos bombas y proveer un cabezal de descarga, la construcción en hormigón de la base para un cabezal de descarga, mejoras al sistema eléctrico con la instalación de un panel de control y sus componentes, construcción de losa de hormigón en el área de las bombas y tuberías de salida, acondicionamiento de la parcela que incluye instalación de verja eslabonada en un lado y pintura de las estructuras existentes.
- Trabajos:

  Trabajos completados en un 55.00%. Pendiente finalizar: Instalación de portón de acceso y rótulo de advertencia, suplido e instalación de bombas tipo barril y un cabezal de descarga, instalación de motores a ser provistos por AAA, programación del Panel de Control y "Start-Up" de equipos.

Monto Revisado Contrato
$73,940.00

Construcción de Mejoras a Estación de Bombas de Alcantarillado Sanitario (EBAS) Luchetti, Yauco

- Descripción:
  El proyecto propone mejoras a la EBAS Luchetti como rehabilitación del poceto recibidor y el poceto de bombas, estandarización de bombas sumergibles, cambio de tuberías de salida, mejoras a la caseta de control y mejoras a la parcela (accesos y verjas).

- Trabajos:
  Los Trabajos comenzarán en enero de 2013.

Monto Contrato	Órdenes de Cambio	Monto Revisado Contrato
$159,623.00	$0.00	$159,623.00

RESUMEN DE LOGROS

❖ Comunicaciones

❖ De 2009 al 2012 se efectuaron campañas de medios y orientaciones sobre importancia de proteger los hidrantes y hacer uso adecuado del alcantarillado sanitario, lo que permitió crear conciencia entre la comunidad.

❖Reconocimientos a personal destacado por sus ejecutorios en Servicio al Cliente, Operaciones Comerciales, Operaciones y departamentos de apoyo.

- ❖Empleados Símbolos
- ❖Métricas en Servicio al Cliente y Operaciones Comerciales
- ❖Ganadores Competencias de Sabor del Agua
- ❖Ganadores Equipo Sur "Los Mejores" en OperComp- Tercer Lugar.

❖ Inauguraciones
❖Proyecto "Mi escuela en tus Manos"- Esc. Tallaboa Alta- La Moca en Peñuelas
❖Ferias de Servicio
❖Relaciones con Medios y la Comunidad

❖Pendiente: Inauguraciones de PAS Lajas, PF Patillas, PAS Maunabo, proyectos de alcantarillados Lluveras y de distribución La Jurada; proyecto aereación lago Toa Vaca en Villalba.

COMPETENCIA REGIONAL DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

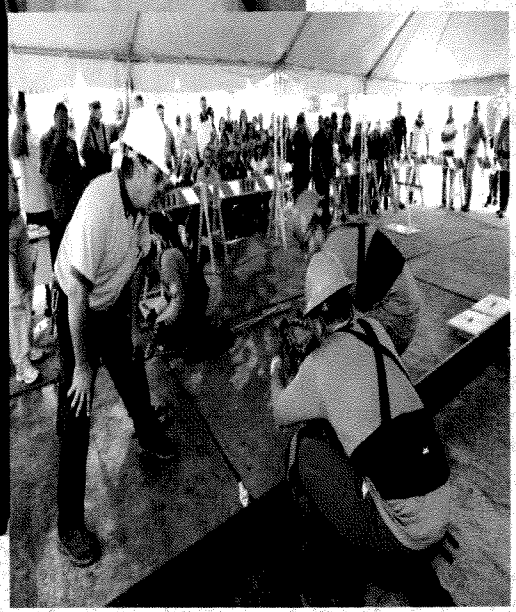

INICIO PROYECTO AIREACIÓN DEL LAGO TOA VACA EN VILLALBA

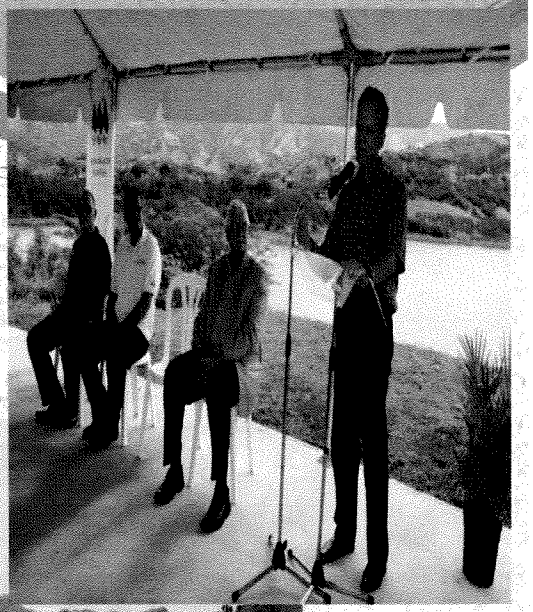

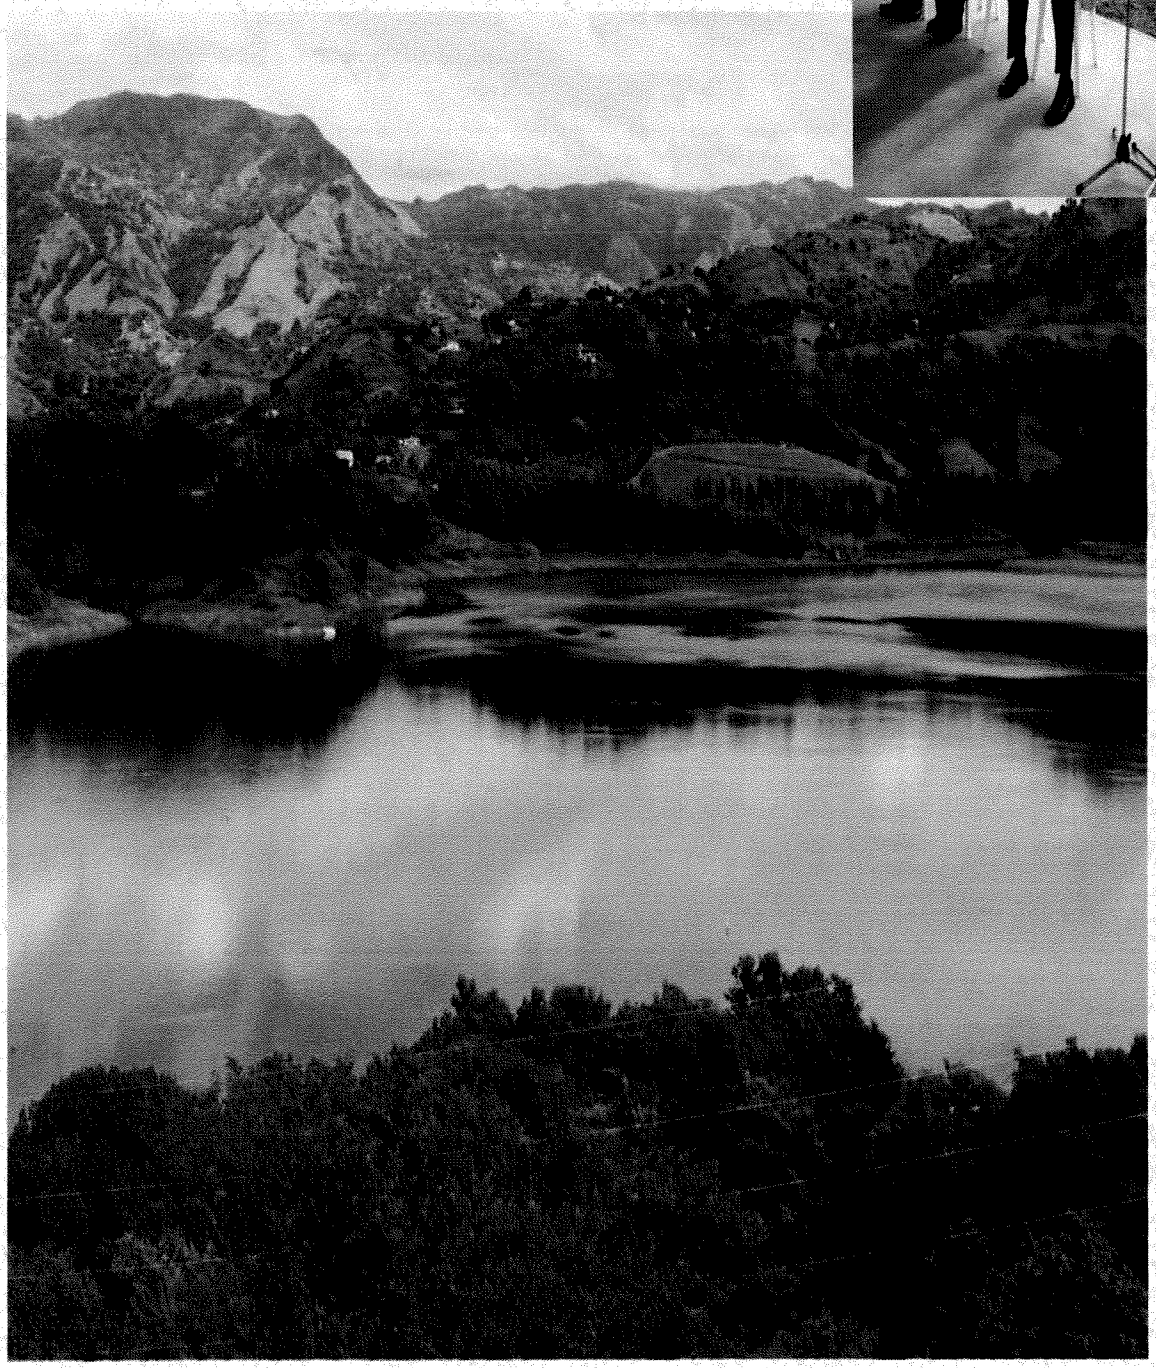

RECONOCIMIENTO PERSONAL PF TOA VACA EN VILLALBA

Premio Obra Sobresaliente Infraestructura 2012 otorgado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
